

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PF 001 L/2025 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA PROYECTO DE PANTEÓN MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.;

**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Contrato:** PF 001 L/2025

**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

**Contratista:** INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.

**Programa:** U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.

**Inicio Vigente:** miércoles, 27 de agosto de 2025

**Días de Obra:** 21

**Subprograma:** 03 SERVICIOS

**Inicio Real:** miércoles, 27 de agosto de 2025

**Monto Contratado:** \$ 147,822.65


**Residente:** ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

**Fin Vigente:** martes, 16 de septiembre de 2025

**Monto Ejercido:** \$ 147,822.65

**Fin Real:** martes, 16 de septiembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/08/2025	26.26%	26.26%	0.00%
2	06/09/2025	71.34%	71.34%	0.00%
3	13/09/2025	97.25%	97.25%	0.00%
4	20/09/2025	100.00%	100.00%	0.00%
5	27/09/2025	100.00%	100.00%	100.00%

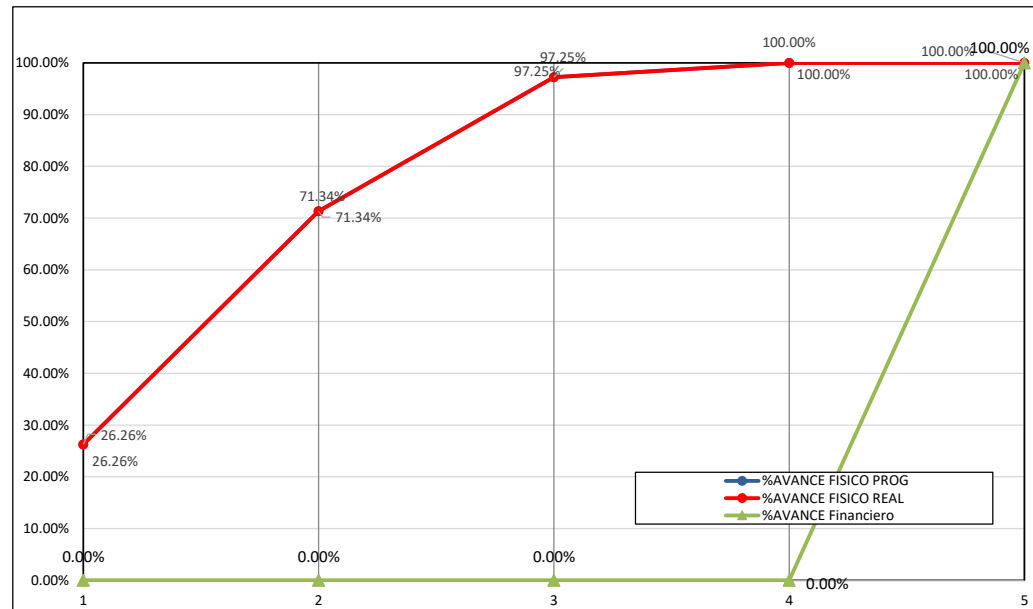

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
