

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 001 M/2025 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA PROYECTO DE PANTEÓN MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.;

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: PF 001 M/2025

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

Contratista: MARYCELA DE LARA CASTAÑEDA,

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.

Inicio Vigente: miércoles, 27 de agosto de 2025

Días de Obra: 180

Subprograma: 03 SERVICIOS

Inicio Real: miércoles, 27 de agosto de 2025

Monto Contratado: \$ 416,920.12


Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Fin Vigente: domingo, 22 de febrero de 2026

Monto Ejercido:

Fin Real: domingo, 22 de febrero de 2026

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/08/2025	6.95%	6.95%	0.00%
2	30/09/2025	48.13%	48.13%	0.00%
3	30/10/2025	72.20%	72.20%	17.53%
4	30/11/2025	95.79%	95.79%	37.84%
5	31/12/2025	98.45%	98.45%	71.23%
6	31/01/2026	99.34%		
7	28/02/2026	100.00%		
8	30/03/2026	100.00%		
9	29/04/2026	100.00%		

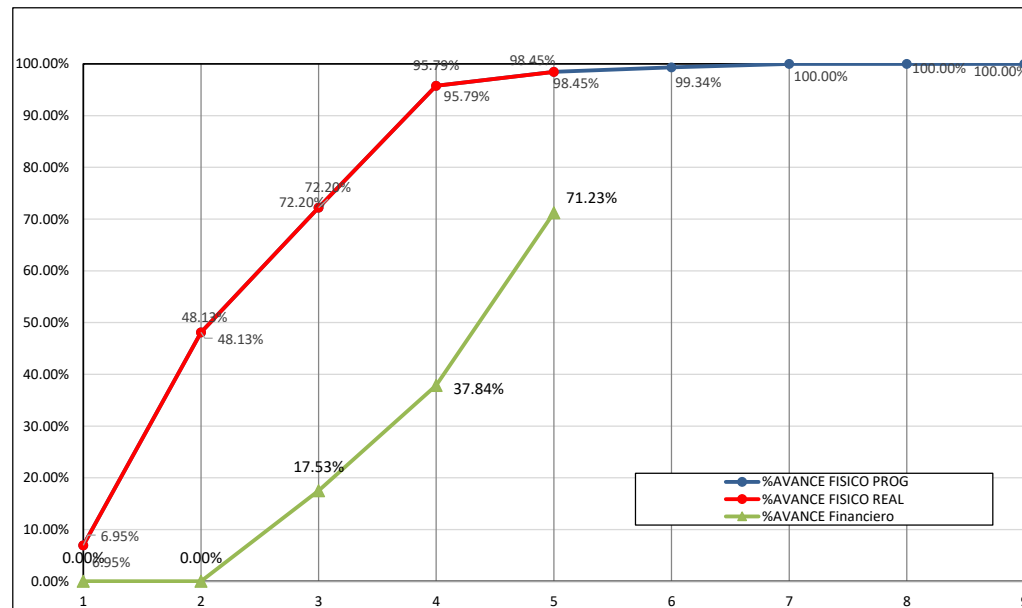

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
