

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PF 001 N/2025 ESTUDIOS GEOFÍSICO Y GEOLÓGICO PARA PROYECTO DE PANTEÓN MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.

**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Contrato:** PF 001 N/2025

**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

**Contratista:** GEOFISICA APLICADA A LA GEOTECNIA, S.C

**Programa:** U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.

**Inicio Vigente:** miércoles, 10 de septiembre de 2025

**Días de Obra:** 60

**Subprograma:** 03 SERVICIOS

**Inicio Real:** miércoles, 10 de septiembre de 2025

**Monto Contratado:** \$ 66,070.54


**Residente:** ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

**Fin Vigente:** sábado, 8 de noviembre de 2025

**Monto Ejercido:** \$ 66,070.54

**Fin Real:** sábado, 8 de noviembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	17/09/2025	49.99%	49.99%	0.00%
2	24/09/2025	51.89%	51.89%	0.00%
3	01/10/2025	53.78%	53.78%	0.00%
4	08/10/2025	55.61%	55.61%	0.00%
5	15/10/2025	57.57%	57.57%	0.00%
6	22/10/2025	59.46%	59.46%	0.00%
7	29/10/2025	85.22%	85.22%	0.00%
8	05/11/2025	94.31%	94.31%	0.00%
9	12/11/2025	100.00%	100.00%	100.00%

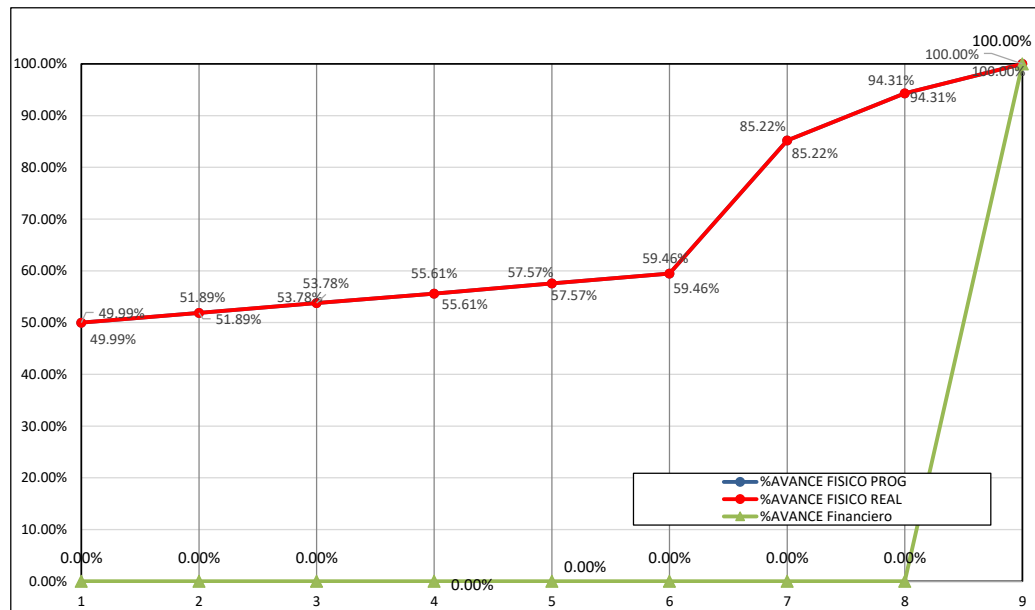

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
