


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF 001 O/2025 PROYECTO ELECTRICO, MEMORIAS TECNICAS DESCRIPTIVAS, UNIDAD DE VERIFICACIÓN PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS ESC. NICOLAS BRAVO EN LA ESCONDIDA, ESC. PABLO LATAPI SARRE EN LA RIBERA, ESC. SEC. TEC. 45 EN BARRIOS DE LA PROVINCIA ESC. SEC. TEC. 46 JOSÉ REFUGIO REYES EN LA RIBERA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	PF 001 O/2025		
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	Contratista:	CR 18 DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente:	miércoles, 5 de noviembre de 2025	Días de Obra:	120
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	miércoles, 5 de noviembre de 2025	Monto Contratado:	\$ 335,264.02
Residente:	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	Fin Vigente:	miércoles, 4 de marzo de 2026	Monto Ejercido:	
		Fin Real:	miércoles, 4 de marzo de 2026		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	08/11/2025	4.41%	4.41%	0.00%
2	09/12/2025	43.28%	43.28%	45.17%
3	08/01/2026	53.14%		
4	08/02/2026	64.77%		
5	10/03/2026	100.00%		
6	10/04/2026			
7	09/05/2026			
8	08/06/2026			
9	09/07/2026			

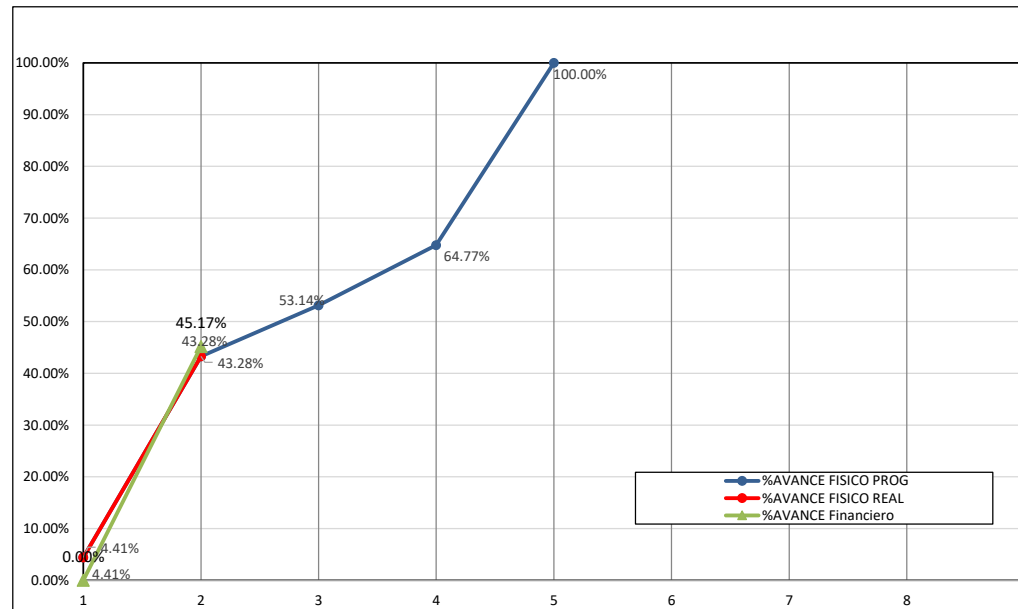

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
