


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF 001 P/2025 PROYECTO ELECTRICO, MEMORIAS TECNICAS DESCRIPTIVAS, UNIDAD DE VERIFICACIÓN PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS ESC. NICOLAS BRAVO EN LA ESCONDIDA, ESC. PABLO LATAPI SARRE EN LA RIBERA, ESC. SEC. TEC. 45 EN BARRIOS DE LA PROVINCIA ESC. SEC. TEC. 48 JOSÉ REFUGIO REYES EN LA RIBERA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	PF 001 P/2025
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	Contratista:	C. JULIO CESAR RIOS VAZQUEZ
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente:	sábado, 29 de noviembre de 2025
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	sábado, 29 de noviembre de 2025
Residente:	ARQ. HUMBERTO MIGUEL MELGAR ROMO	Fin Vigente:	sábado, 28 de marzo de 2026
		Fin Real:	sábado, 28 de marzo de 2026
		Días de Obra:	120
		Monto Contratado:	\$ 501,084.98
		Monto Ejercido:	

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/11/2025	16.13%	16.13%	0.00%
2	15/12/2025	76.34%	76.34%	33.58%
3	30/12/2025	85.87%	85.87%	33.58%
4	15/01/2026	87.83%		
5	30/01/2026	89.93%		
6	15/02/2026	91.89%		
7	01/03/2026	93.60%		
8	15/03/2026	95.93%		
9	30/03/2026	100.00%		
10	15/04/2026	100.00%		

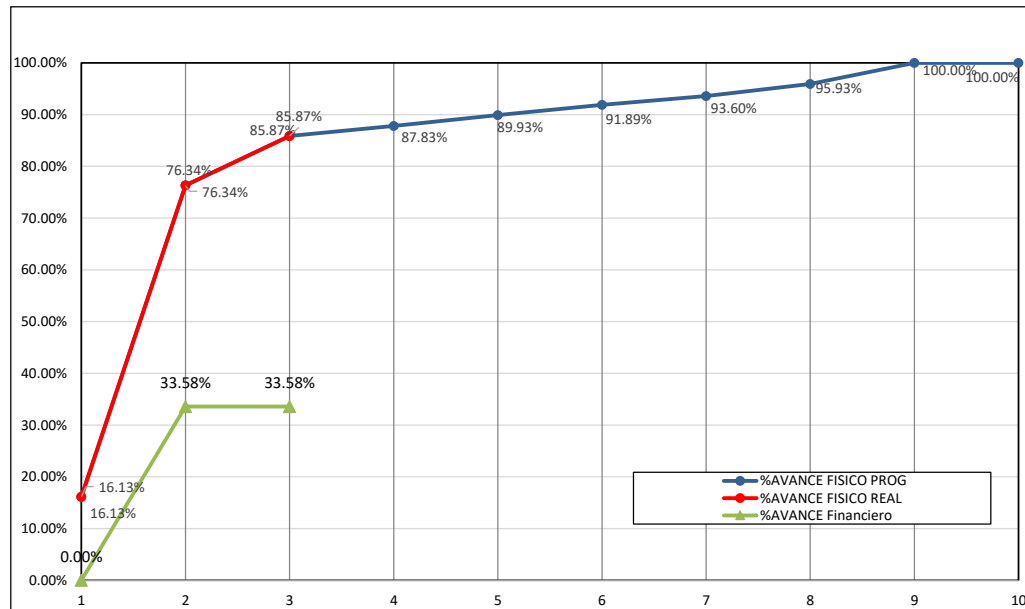

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
