

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 002/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, EN CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE RÍO SAN PEDRO; REHABILITACIÓN DE RED DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE JOSÉ MA. MORELOS; RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE RÍO SAN PEDRO; SEÑALIZACIÓN EN VIALIDADES EN CALLES DEL CENTRO TRADICIONAL: ILUMINACIÓN EN MURALES Y JARDINERÍA EN CALLE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Ubicación: Contrato: PF 002/2025

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 **Contratista:** ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. ("El Asociante")
JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ("El Asociado")


Programa: SF,SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN, SD ALCANTARILLADO, SC AGUA **Inicio Vigente:** viernes, 9 de mayo de 2025 **Días de Obra:** 120

Subprograma: 01,03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS **Inicio Real:** viernes, 9 de mayo de 2025 **Monto Contratado:** \$ 11,529,671.83

Residente: ARQ. GUSTAVO DE SANTIAGO REYES **Fin Vigente:** viernes, 5 de septiembre de 2025 **Monto Ejercido:** \$ 11,509,884.29

Fin Real: viernes, 5 de septiembre de 2025 Se solicita nota de credito

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/05/2025	1.36%	1.44%	50.00%
2	30/05/2025	7.91%	10.10%	58.26%
3	15/06/2025	13.65%	26.09%	63.35%
4	30/06/2025	17.78%	42.07%	63.35%
5	15/07/2025	38.37%	58.59%	76.48%
6	30/07/2025	61.77%	72.48%	76.48%
7	15/08/2025	83.58%	84.00%	76.48%
8	30/08/2025	98.94%	98.94%	76.48%
9	15/09/2025	100.00%	100.00%	92.92%
10	30/09/2025	100.00%	100.00%	100.00%

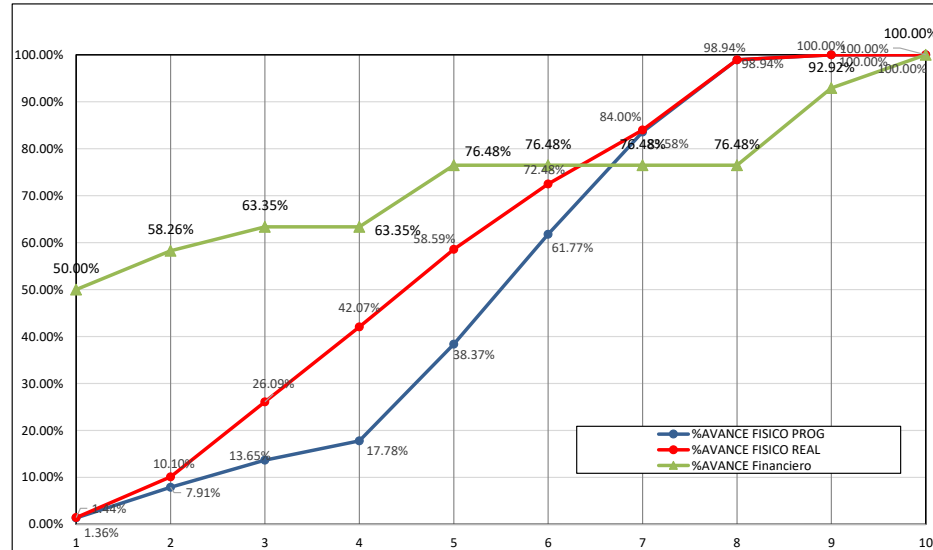

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
