


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	PF 004/2025 REHABILITACIÓN DE SOCAVON EN LA CALLE PROGESO INTERSECCIÓN CON CALLE JUSTICIA, EN EL FRACC. SAN JOSÉ DEL BARRANCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, ESTADO DE AGUASCALIENTES				
<b>Ubicación:</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contrato:</b>	PF 004/2025		
<b>Tipo de inversión:</b>	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	<b>Contratista:</b>	O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.		
<b>Programa:</b>	SD ALCANTARILLADO	<b>Inicio Vigente:</b>	martes, 26 de agosto de 2025	<b>Días de Obra:</b>	<b>15</b>
<b>Subprograma:</b>	01 REHABILITACIÓN	<b>Inicio Real:</b>	martes, 26 de agosto de 2025	<b>Monto Contratado:</b>	<b>\$ 667,917.80</b>
<b>Residente:</b>	ARQ. JOSE DE JESUS ESPARZA CALDERA	<b>Fin Vigente:</b>	martes, 9 de septiembre de 2025	<b>Monto Ejercido:</b>	<b>\$ 667,917.80</b>
		<b>Fin Real:</b>	martes, 9 de septiembre de 2025		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	26/08/2025	16.78%	16.78%	0.00%
2	02/09/2025	84.79%	84.79%	0.00%
3	09/09/2025	100.00%	100.00%	0.00%
4	16/09/2025	100.00%	100.00%	100.00%

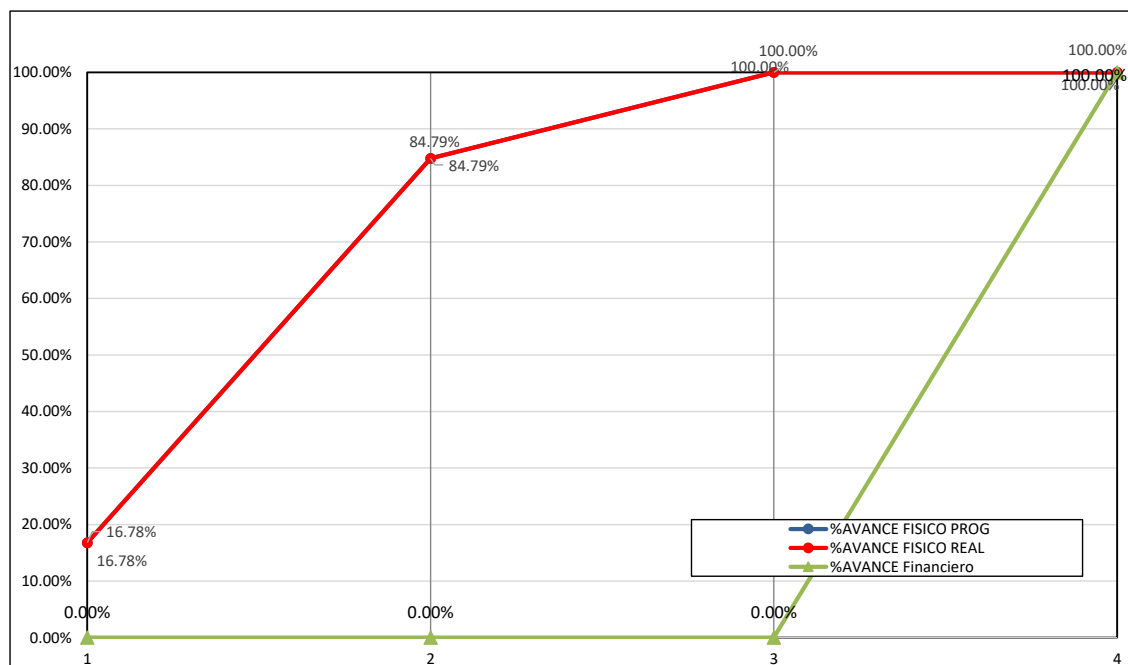

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
