

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 005/2025 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA USO DOMÉSTICO EN LA COMUNIDAD EL PUERTECITO DE LA VIRGEN, CALLE OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, DE CALLE LA ESCONDIDA A PROL. 24 DE DICIEMBRE
 PF 006/2025 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA USO DOMÉSTICO EN LA COMUNIDAD EL PUERTECITO DE LA VIRGEN, CALLE LORETITO DE CALLE VIÑEDOS RIBIER A CALLE PROL. 24 DE DICIEMBRE
 PF 007/2025 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA USO DOMÉSTICO EN LA COMUNIDAD EL PUERTECITO DE LA VIRGEN, CALLE VIÑEDOS RIBIER DE CALLE LORETITO A FIN DE CALLE NORTE.
 PFFR 001/2025 ILUMINACION TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Ubicación: PUERTECITO DE LA VIRGEN **Contrato:** PF 005 006 007 PFFR 001/2025

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 **Contratista:** ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,


Programa: SG ELECTRIFICACIÓN **Inicio Vigente:** viernes, 24 de octubre de 2025 **Días de Obra:** 60

Subprograma: 02 b RURAL AMPLIACIÓN **Inicio Real:** viernes, 24 de octubre de 2025 **Monto Contratado:** \$3,661,587.75

Residente: ARQ. BENJAMIN SALAZAR GONZALEZ **Fin Vigente:** lunes, 22 de diciembre de 2025 **Monto Ejercido:**

Fin Real: lunes, 22 de diciembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/10/2025	19.83%	19.83%	64.50%
2	30/11/2025	69.67%	69.67%	75.15%
3	30/12/2025	100.00%	100.00%	84.07%
4	29/01/2026	100.00%	100.00%	

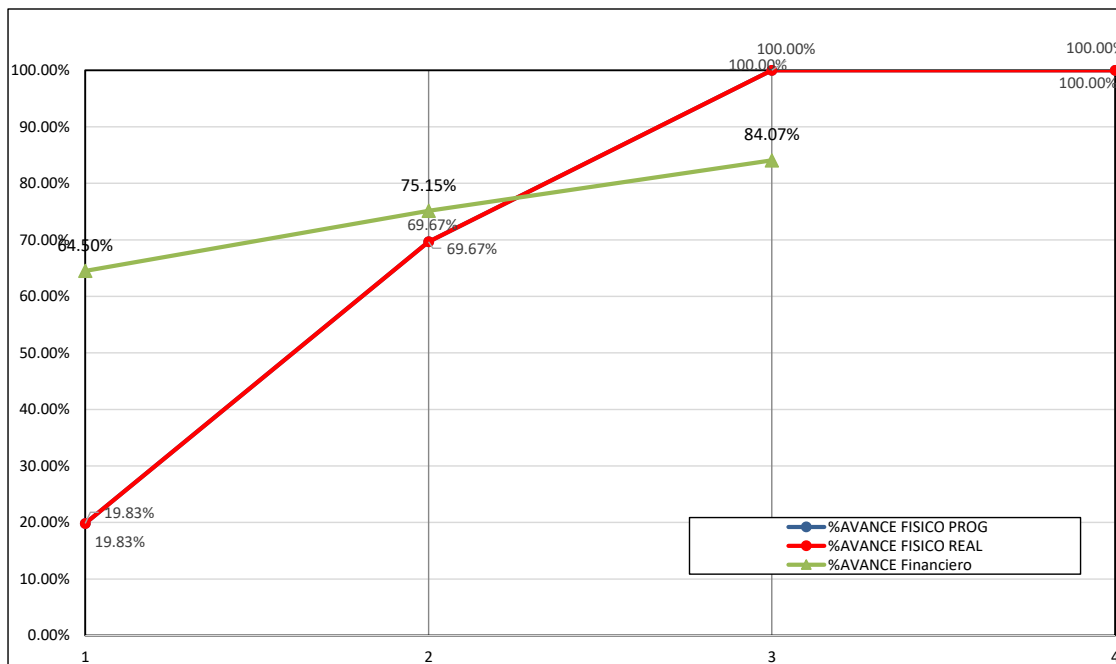

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO**
