

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 008/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. BENITO JUAREZ, MACARIO J. GÓMEZ

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: PF 008/2025

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

Contratista: CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.,

Programa: SD ALCANTARILLADO

Inicio Vigente: viernes, 10 de octubre de 2025

Días de Obra: 15

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Inicio Real: viernes, 10 de octubre de 2025

Monto Contratado: \$ 331,558.52


Residente: ARQ. JOSE DE JESUS ESPARZA CALDERA

Fin Vigente: sábado, 8 de noviembre de 2025

Monto Ejercido: \$ 331,558.52

Fin Real: sábado, 8 de noviembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	11/10/2025	5.55%	6.84%	0.00%
2	18/10/2025	33.56%	34.55%	0.00%
3	25/10/2025	60.96%	60.96%	0.00%
4	01/11/2025	75.21%	75.21%	72.30%
5	08/11/2025	100.00%	100.00%	72.30%
6	15/11/2025	100.00%	100.00%	72.30%
7	22/11/2025	100.00%	100.00%	96.36%
8	29/11/2025	100.00%	100.00%	100.00%

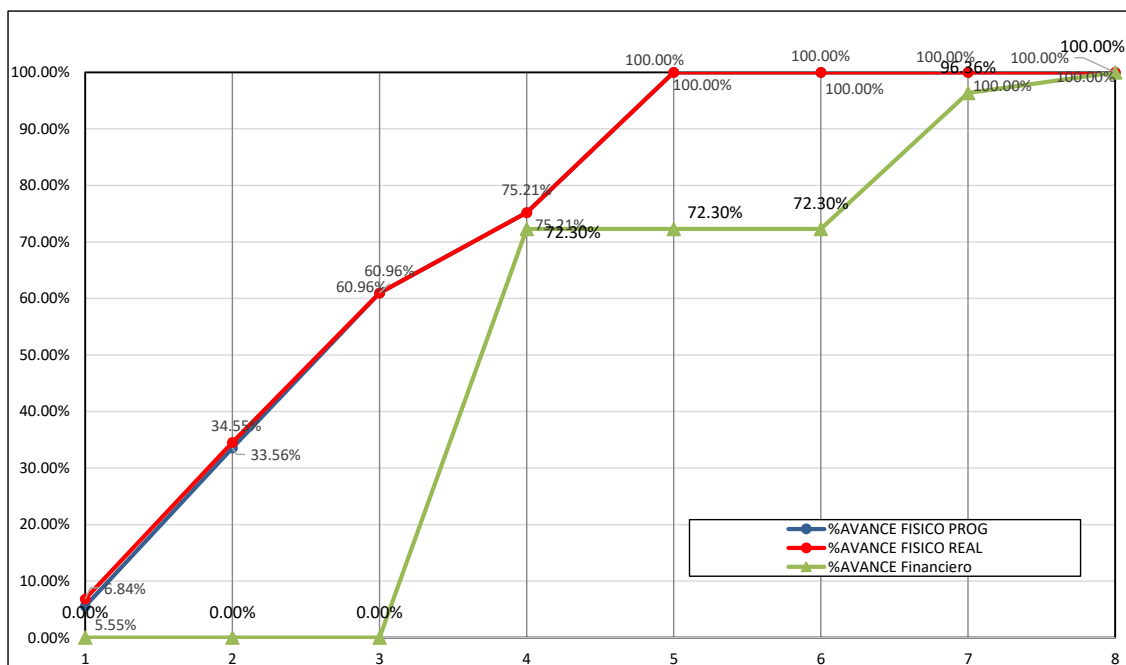

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
