

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PF 009/2025 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN

**Ubicación:** LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

**Programa:** DA EDIFICIOS PÚBLICOS

**Subprograma:** 03 CONSTRUCCIÓN

**Residente:** ARQ. JOSE ALFREDO DE VELASCO LARA

**Contrato:** PF 009/2025

**Contratista:** ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,

**Inicio Vigente:** viernes, 19 de diciembre de 2025

**Días de Obra:** 90

**Inicio Real:** viernes, 19 de diciembre de 2025


**Monto Contratado:** \$3,500,000.00

**Fin Vigente:** miércoles, 18 de marzo de 2026

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:** miércoles, 18 de marzo de 2026

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/12/2025	31.97%	31.97%	49.51%
2	30/01/2026	76.10%		
3	28/02/2026	96.81%		
4	30/03/2026	100.00%		
5	30/04/2026			
6	30/05/2026			
7	29/06/2026			
8	30/07/2026			

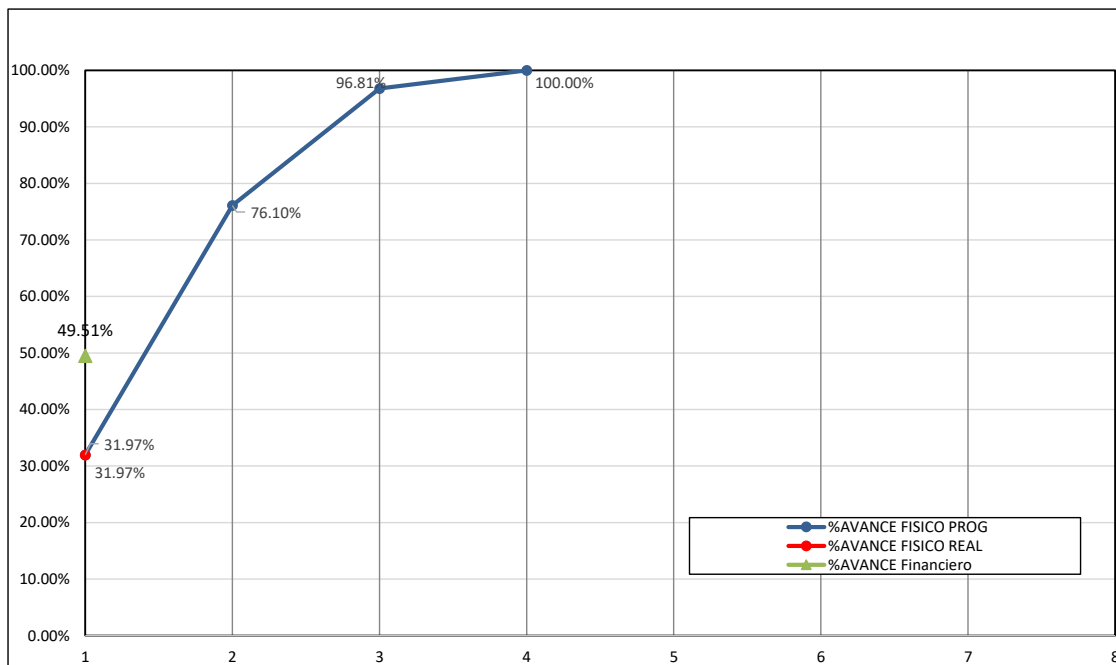

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
