

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 010/2025 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA AIRES ACONDICIONADOS ESC. NICOLAS BRAVO, LA ESCONDIDA, ESC. PRIMARIA PABLO LATAPI, LA RIBERA, ESC. SEC TECNICA No. 45, PASEOS DE LA PROVIDENCIA Y ESC. SEC. TEC No. 40 JOSE REFUGIO REYES LA RIBERA.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** PF 010/2025

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 **Contratista:** SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VERANTA, S. DE R.L. DE C.V.,


Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA **Inicio Vigente:** viernes, 26 de diciembre de 2025 **Días de Obra:** 60

Subprograma: 02 (b,c) CONSTRUCCIÓN (PRIMARIA Y SECUNDARIA) **Inicio Real:** viernes, 26 de diciembre de 2025 **Monto Contratado:** \$2,840,256.93

Residente: ARQ. JAIME ADAIR ESPINOSA MORA **Fin Vigente:** lunes, 23 de febrero de 2026 **Monto Ejercido:**

Fin Real: lunes, 23 de febrero de 2026

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/12/2025	14.91%	14.91%	50.00%
2	30/01/2026	90.08%		
3	01/03/2026	100.00%		
4	31/03/2026			
5	30/04/2026			
6	30/05/2026			
7	29/06/2026			
8	29/07/2026			

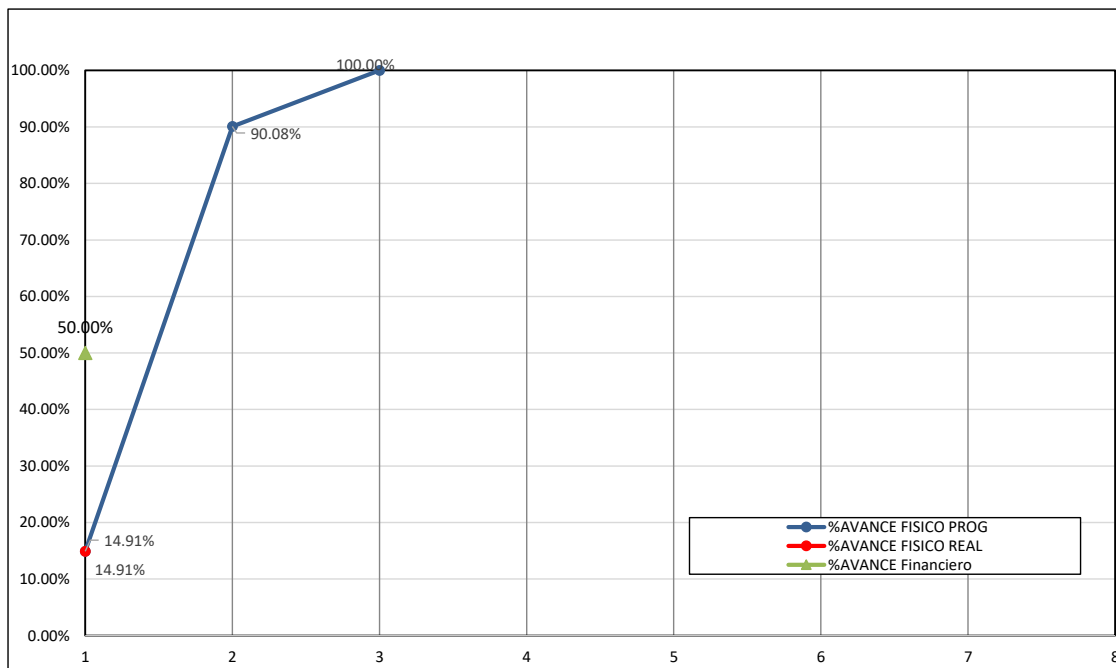

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
