

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PF24 001/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETA, SENALÉTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ARTÍCULO 27  
 PF24 002/2025 REGENERACIÓN DE CRUCEROS PEATONALES, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA EN CALLE DECRETO 30 DE ENERO DE 1992

**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO      **Contrato:** PF24 001 002/2025

**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL 2024      **Contratista:** EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V. (ASOCIANTE)  
 JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (ASOCIADO)


**Programa:** SE URBANIZACIÓN, SF PAVIEMNTACION EN COLONIAS PUPULARES, SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE      **Inicio Vigente:** miércoles, 2 de julio de 2025      **Días de Obra:** 90

**Subprograma:** 01,03,05 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANCHEAS, ALUMBRADO PÚBLICO      **Inicio Real:** miércoles, 2 de julio de 2025      **Monto Contratado:** \$11,735,590.73

**Residente:** ARQ. HUMBERTO MIGUEL MELGAR ROMO      **Fin Vigente:** lunes, 29 de septiembre de 2025      **Monto Ejercido:** \$11,710,091.57

**Fin Real:** lunes, 29 de septiembre de 2025      Se solicita nota de credito

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	29/07/2025	45.10%	45.18%	42.24%
2	29/08/2025	82.80%	82.86%	58.02%
3	29/09/2025	100.00%	100.00%	87.39%
4	29/10/2025	100.00%	100.00%	100.00%

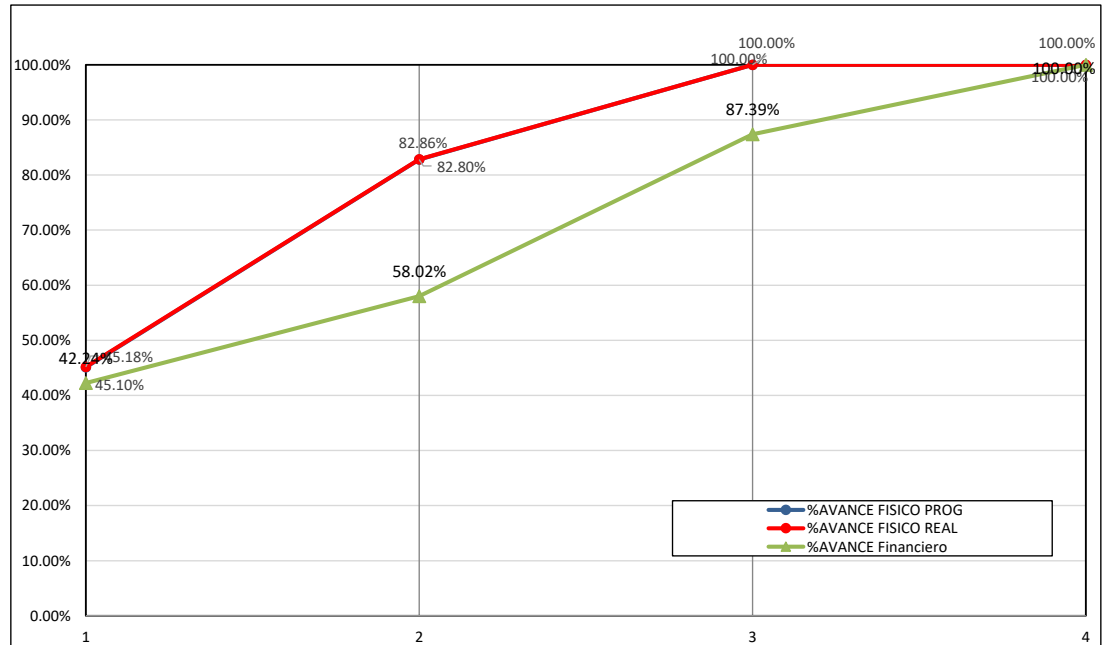

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
