

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 001 A/2026 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 1 OBRA (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL VÍAS DE FERROCARRIL LÍNEA "A" Km 606+242.159 EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES).

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** PF 001 A/2026

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 **Contratista:** C. Julio Cesar Ríos Vázquez


Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG. **Inicio Vigente:** jueves, 12 de febrero de 2026 **Días de Obra:** 180

Subprograma: 03 SERVICIOS **Inicio Real:** lunes, 10 de agosto de 2026 **Monto Contratado:** \$ 113,328.96

Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES **Fin Vigente:** jueves, 12 de febrero de 2026 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/02/2026	0.00%	0.00%	0.00%
2	28/02/2026	0.00%	0.00%	0.00%
3	15/03/2026	25.71%	25.71%	0.00%
4	30/03/2026	25.71%	25.71%	0.00%
5	15/04/2026	28.73%	28.73%	0.00%
6	30/04/2026			
7	15/05/2026			
8	30/05/2026			
9	14/06/2026			
10	30/06/2026			
11	15/07/2026			
12	30/07/2026			
13	15/08/2026			
14	30/08/2026			
15	15/09/2026			
16	30/09/2026			

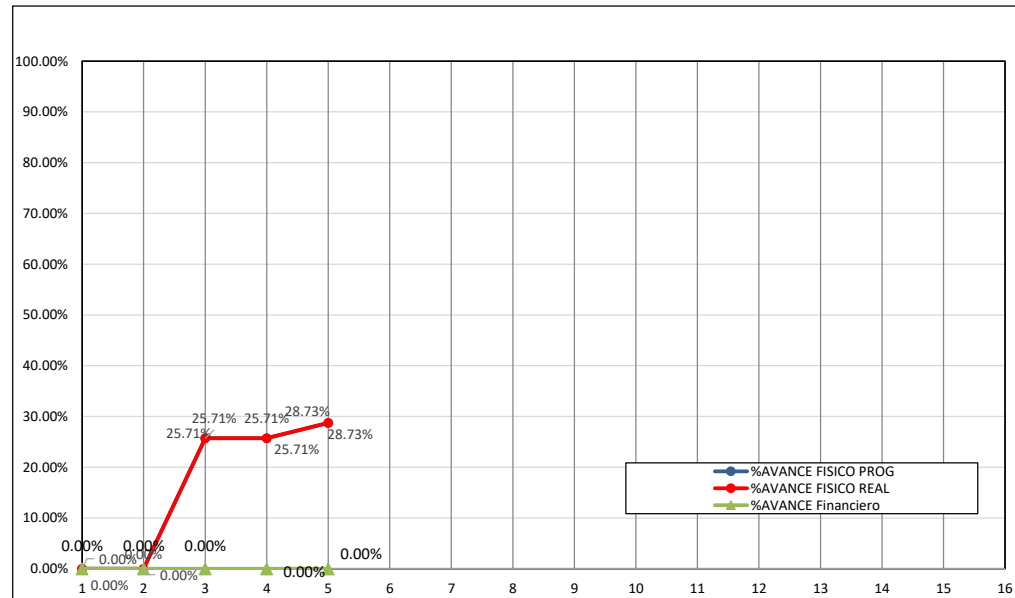

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
