

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 001B/2026 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRABAJOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE CABECERA MUNICIPAL, COMUNIDAD DE AMAPOLAS DEL RÍO Y COMUNIDAD BORROTES, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. Y ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA LOS LIRIOS, CENTROS COMUNITARIOS EN PUERTECITO DE LA VIRGEN Y FRACC. LA RIBERA Y ESCULTURA MONUMENTAL EN COLONIA SAN JOSÉ DE BUENAVISTA.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** PF 001 B/2026

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 **Contratista:** INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.


Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG. **Inicio Vigente:** viernes, 20 de marzo de 2026 **Días de Obra:** 35

Subprograma: 03 SERVICIOS **Inicio Real:** jueves, 23 de abril de 2026 **Monto Contratado:** \$ 509,477.61

Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES **Fin Vigente:** viernes, 20 de marzo de 2026 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/03/2026	23.52%	23.52%	0.00%
2	28/03/2026	45.08%	45.08%	0.00%
3	04/04/2026	73.42%	73.42%	0.00%
4	11/04/2026	87.37%		
5	18/04/2026	98.85%		
6	25/04/2026	100.00%		
7	02/05/2026	100.00%		
8	09/05/2026	100.00%		
9	16/05/2026	100.00%		
10	23/05/2026	100.00%		
11	30/05/2026	100.00%		
12	06/06/2026	100.00%		
13	13/06/2026	100.00%		

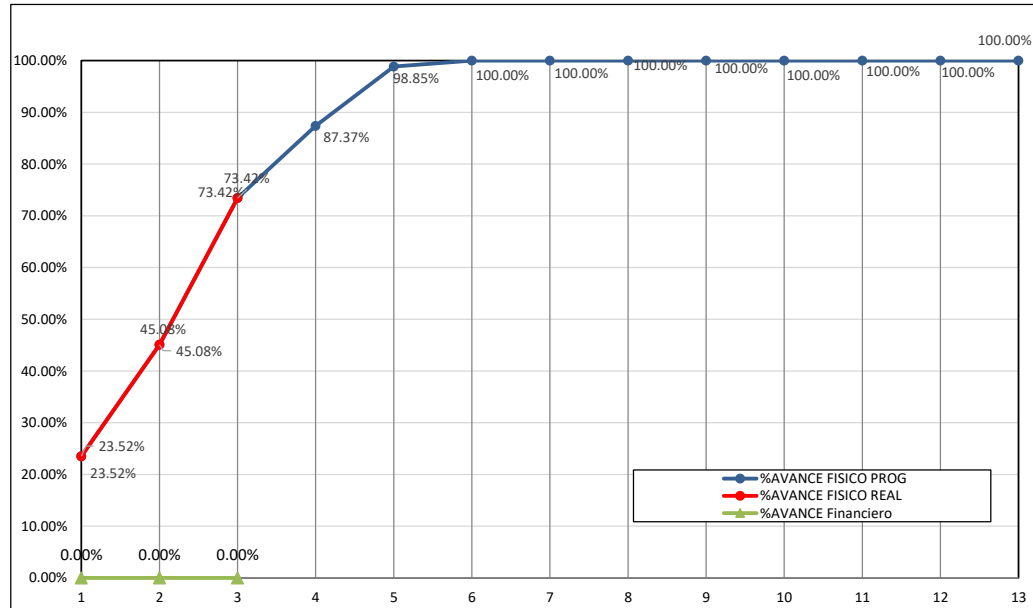

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO**
