

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001/2022 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CASA DEL ABUELO, PUERTECITO DE LA VIRGEN, CON DOS SONDEOS TIPO MIXTO A 6 M DE PROFUNDIDAD EMPLEANDO EQUIPO ROTARIO DE PERFORACIÓN MOBIL DRILL B53 CON HELICOIDE SÓLIDO Y PR PUERTECITO DE LA VIRGEN

Ubicación: IP 001 B/2022

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS 2022


Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES.REG. Ingreso Vigente: jueves, 24 de febrero de 2022

Subprograma: 03 SERVICIOS

Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Días de Obra: 5
 Monto Contratado: \$46,110.00
 Monto Ejercido: \$46,110.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FÍSICO PROG	%AVANCE FÍSICO REAL	%AVANCE Financiero
1	24/02/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	28/02/2022	100.00%	100.00%	0.0%
3	14/03/2022	100.00%	100.00%	100.0%

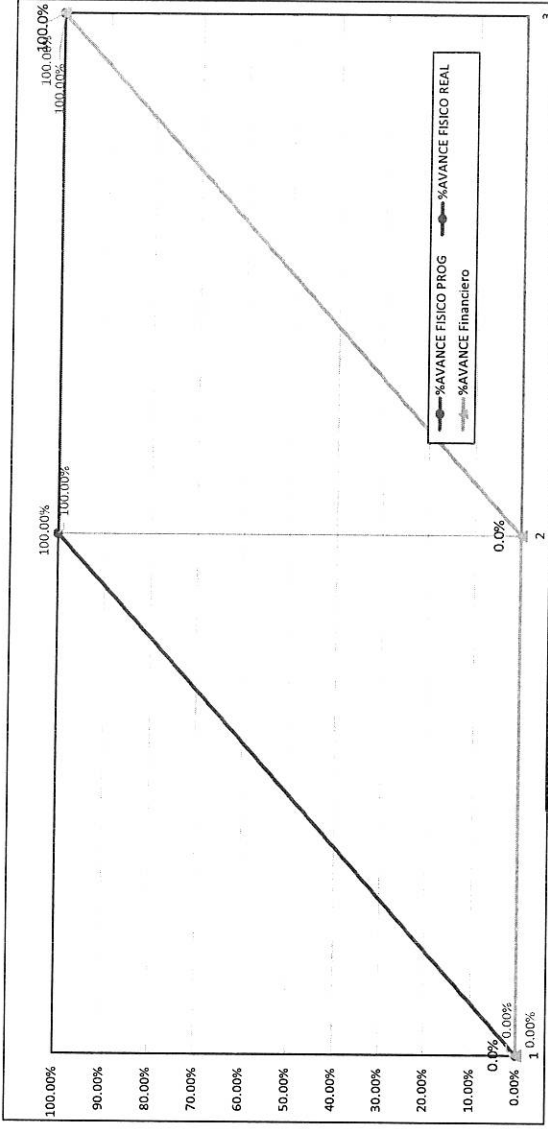

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
