


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FR 002/22 MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES ESCOLARES
Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** FR 002-003/2022
Tipo de inversión: FONDO RESARCITORIO 2022 **Contratista:** C. I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez
Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA **Inicio Vigente:** miércoles, 30 de noviembre de 2022 **Días de Obra:** 30 días
Subprograma: 01 REHABILITACION **Inicio Real:** miércoles, 30 de noviembre de 2022 **Monto Contratado:** \$1,590,678.21
Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES **Fin Vigente:** jueves, 29 de diciembre de 2022 **Monto Ejercido:** \$1,590,678.21
Fin Real: jueves, 29 de diciembre de 2022

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 30/11/2022 | 0.00% | 0.00% | 50.0% |
| 2 | 07/12/2022 | 46.34% | 47.30% | 57.2% |
| 3 | 14/12/2022 | 76.87% | 77.80% | 57.2% |
| 4 | 21/12/2022 | 97.26% | 97.64% | 57.2% |
| 5 | 29/12/2022 | 100.00% | 100.00% | 57.2% |
| 6 | 04/01/2023 | 100.00% | 100.00% | 57.2% |
| 7 | 11/01/2023 | 100.00% | 100.00% | |
| 8 | 18/01/2023 | 100.00% | 100.00% | |

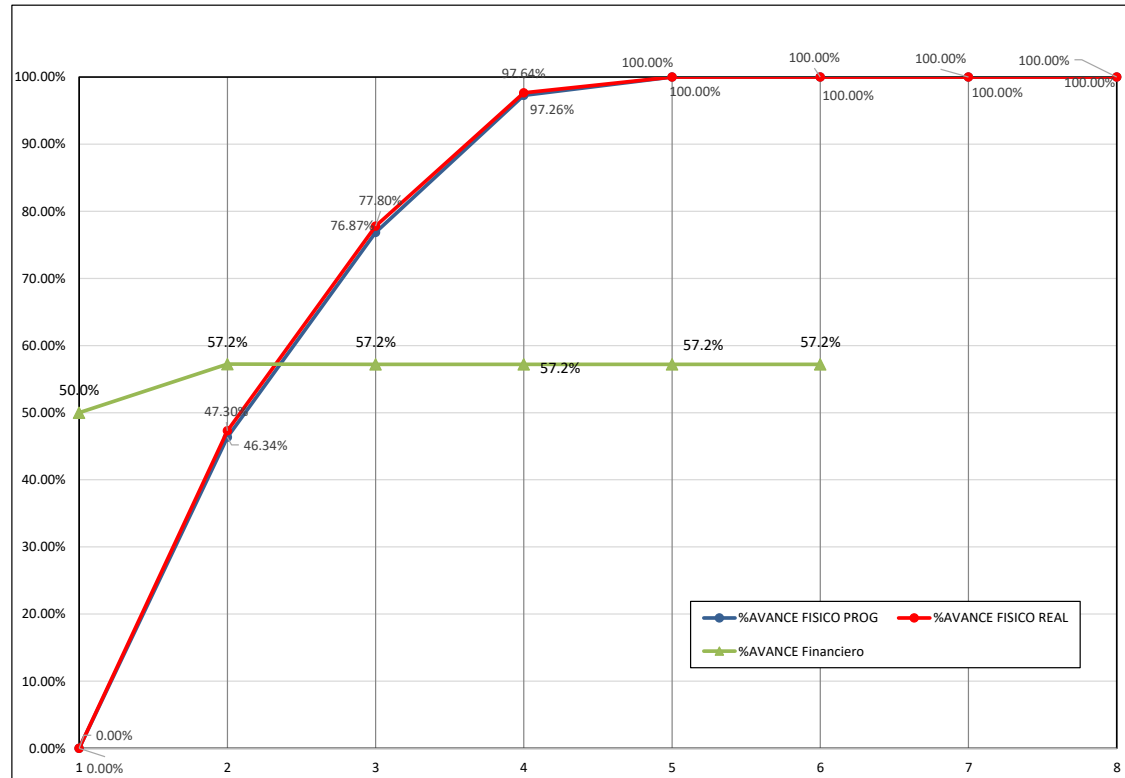

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
