


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 002/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE JOSÉ MA. MORELOS,
 PF 003/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE JOSÉ MA. MORELOS
 PF 005/2023 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE JOSÉ MA. MORELOS, MORELOS CARRANZA TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE JOSÉ MA. MORELOS,

Ubicación: FRACC. LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL
Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2023
Programa: DS ALCANTARILLADO
 SC AGUA POTABLE
 SF,SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN
Subprograma: 01 REHABILITACION
 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
Residente: ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA

Contrato: PF 002 003 005 /2023
Contratista: DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.
Inicio Vigente: viernes, 10 de noviembre de 2023 **Días de Obra:** 45
Inicio Real: viernes, 10 de noviembre de 2023 **Monto Contratado:** \$4,754,274.10
Fin Vigente: domingo, 24 de diciembre de 2023 **Monto Ejercido:**
Fin Real: domingo, 24 de diciembre de 2023

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	10/11/2023	0.00%	0.00%	48.2%
2	20/11/2023	8.23%	8.26%	48.2%
3	04/12/2023	49.44%	49.45%	48.2%
4	20/12/2023	68.21%	68.23%	51.4%
5	04/01/2024	100.00%		
6	19/01/2024	100.00%		
7	03/02/2024	100.00%		
8	18/02/2024	100.00%		
9	04/03/2024	100.00%		

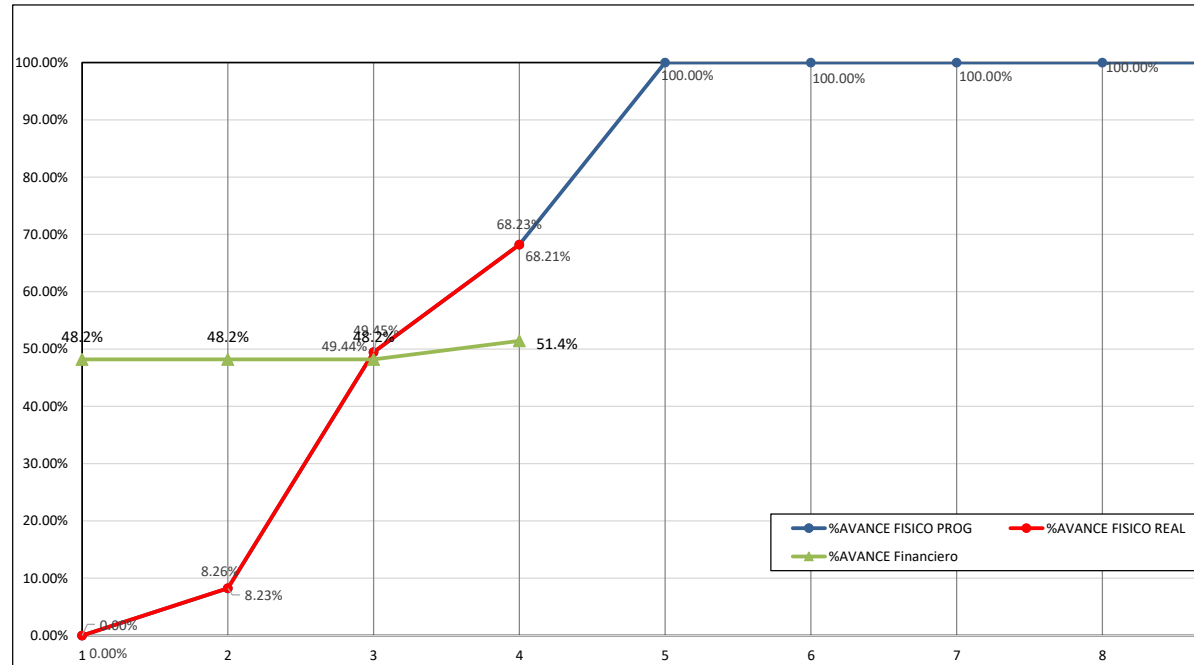

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LC ROMO



DS
