

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 002 006 008 012 013/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE 12 DE DICIEMBRE

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TEODORO OLIVARES DE CALLE FCO. I. MADERO A CALLE ARTICULO 27

REHABILITACIÓN DE LA RED CENTRAL DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE ANTONIO FEMAT DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN A CALLE FRANCISCO VILLA

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CASUARINA DE CALLE ALAMILLO A CALLE MEZQUITE

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SABINO DE CALLE ALAMILLO A CALLE CASUARINA

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** FAISMUN 002 006 008 012 013/2024

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 **Contratista:** CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V


Programa: SF, SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN **Inicio Vigente:** lunes, 6 de mayo de 2024 **Días de Obra:** 90

Subprograma: 01,03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS **Inicio Real:** lunes, 6 de mayo de 2024 **Monto Contratado:** \$16,484,811.88

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** sábado, 3 de agosto de 2024 **Monto Ejercido:**

Fin Real: sábado, 3 de agosto de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	09/05/2024	2.07%	2.09%	50.0%
2	30/05/2024	17.48%	17.49%	51.4%
3	30/06/2024	58.03%	58.04%	55.9%
4	30/07/2024	98.12%		
5	30/08/2024	100.00%		
6	30/09/2024	100.00%		
7	30/10/2024	100.00%		
8	29/11/2024	100.00%		
9	29/12/2024	100.00%		

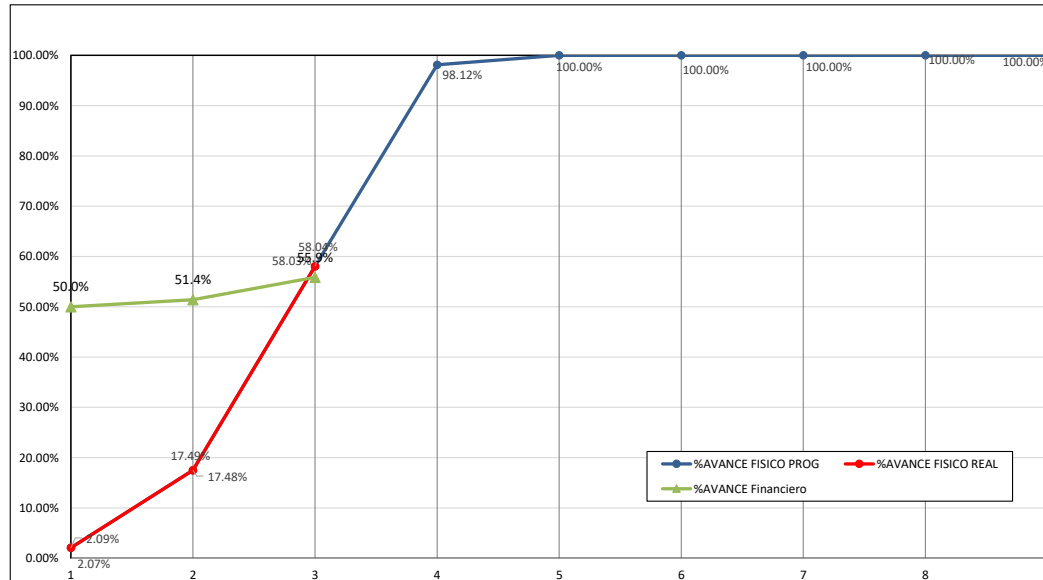

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
