

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 017 FR 001/2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE DE CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE A CALLE VICENTE GUERRERO ORIENTE

RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, TERRACERÍAS Y SEÑALÉTICA, CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE VICENTE GUERRERO.

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** FAISMUN 017 FR 001/2024

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 **Contratista:** CONSTRUCTORA ANTPAT, S.A. DE C.V.


Programa: SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES SE URBANIZACIÓN **Inicio Vigente:** miércoles, 5 de junio de 2024 **Días de Obra:** 30

Subprograma: 01 CONCRETO **Inicio Real:** miércoles, 5 de junio de 2024 **Monto Contratado:** \$946,095.14

Residente: ARQ. FRANCISCO LOZANO SILVA **Fin Vigente:** jueves, 4 de julio de 2024 **Monto Ejercido:**

Fin Real: jueves, 4 de julio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	05/06/2024	0.00%	3.00%	50.0%
2	12/06/2024	12.05%	12.08%	50.0%
3	19/06/2024	25.04%	25.06%	50.0%
4	26/06/2024	77.55%	77.57%	50.0%
5	03/07/2024	94.66%		
6	10/07/2024	100.00%		
7	17/07/2024	100.00%		
8	24/07/2024	100.00%		
9	08/08/2024	100.00%		

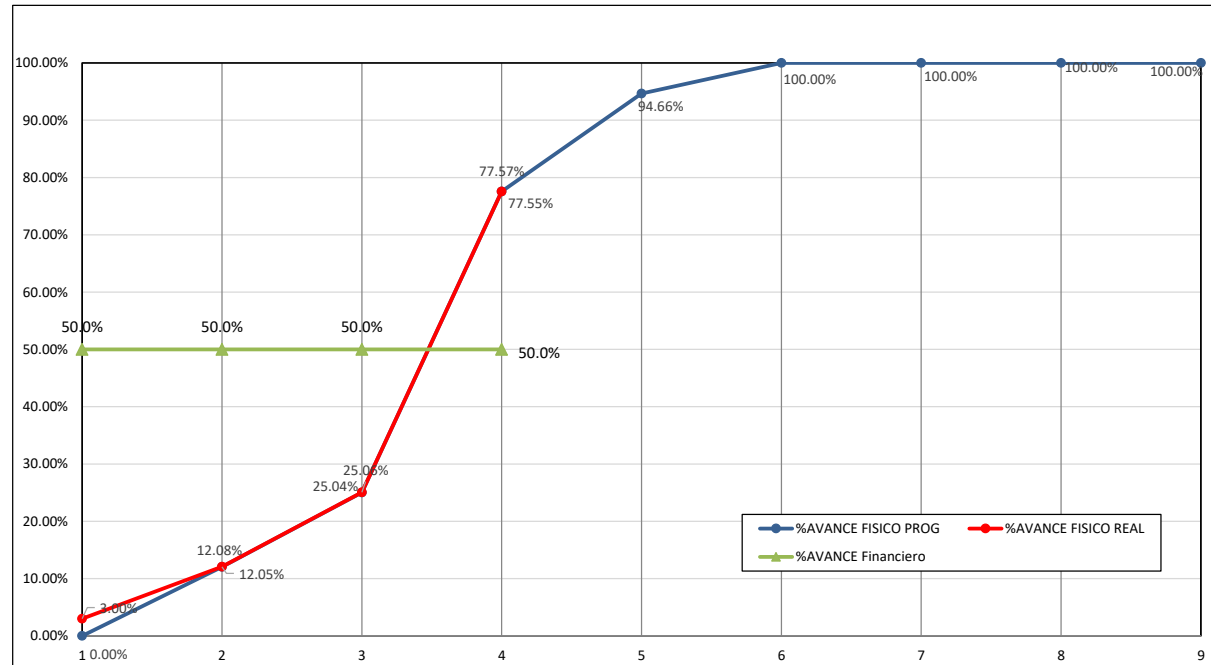

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
