

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-999 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
(EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA DETERMINACIÓN DE DUREZA DE MATERIALES - SONDEOS EXPLORATORIOS EN VARIAS COMUNIDADES DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO PARA CLASIFICACIÓN DE DUREZA DEL TERRENO PARA ZANJAS DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA ELABORACIÓN DE TRES TECHUMBRES EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, CON UN SONDEO CADA UNO, TIPO SPT A 5 m DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO ROTARIO DE PERFORACIÓN Y PRUEBA DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR A CADA METRO CON OBTENCIÓN DE MUESTRAS ALTERADAS CON PENETRÓMETRO Y MUESTREADOR HUECO BIPARTIDO.)

Ubicación: TODO EL MUNICIPIO

Contrato: FISMDF 015/2020

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020

Contratista: Ingeniería, Proyecto y Control de Obra, S. de R.L. de C.V.

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

Inicio Vigente: sábado, 26 de septiembre de 2020

Días de Obra: 21

Subprograma: 01, 03 ESTUDIOS Y PROYECTOS, SERVICIOS

Inicio Real: sábado, 26 de septiembre de 2020

Monto Contratado: \$146,160.00


Residente: I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES

Fin Vigente: sábado, 17 de octubre de 2020

Monto Ejercido: \$146,160.00

Fin Real: sábado, 17 de octubre de 2020

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	29/09/2020	66.00%	70.00%	0.0%
2	06/10/2020	83.97%	89.00%	0.0%
3	13/10/2020	95.88%	97.00%	0.0%
4	20/10/2020	100.00%	100.00%	100.00%

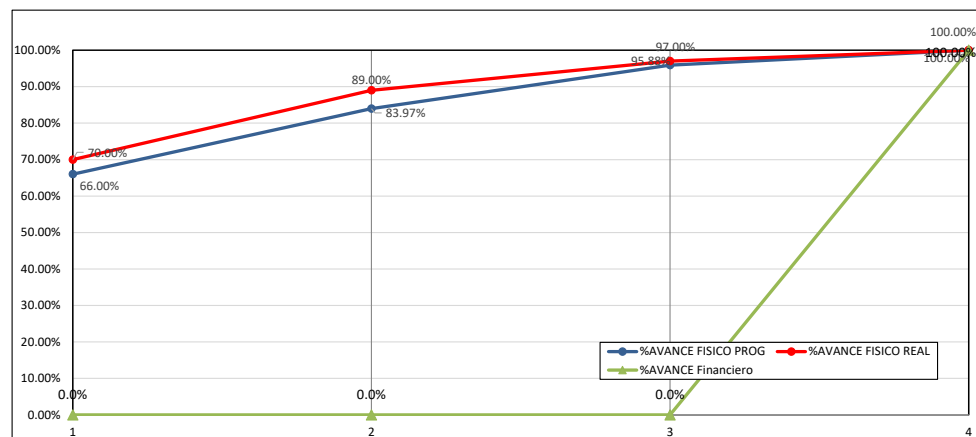

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
