

Obra:

FISMDF 11-001 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NIÑOS HEROES TRAMO CALLE MATAMOROS A CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ, FISMDF 11-002 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE NIÑOS HEROES TRAMO CALLE MATAMOROS A CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ

### GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Ubicación: FRACC. LOS LIRIOS

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

Programa: SP ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

Subprograma: 01 REHABILITACION

Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Contrato: FISMDF 001-002/2021

Contratista: ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


Inicio Vigente: lunes, 16 de agosto de 2021

Inicio Recl: lunes, 16 de agosto de 2021

Fin Vigente: miércoles, 29 de septiembre de 2021

Días de Obra: 45 días  
Monto Contratado: \$1,072,940.00  
Monto Ejercido: \$1,072,940.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	23/08/2021	11.23%	14.00%	50.0%
2	30/08/2021	22.59%	26.00%	50.0%
3	06/09/2021	34.42%	36.00%	50.0%
4	13/09/2021	53.76%	60.00%	66.0%
5	20/09/2021	66.49%	77.20%	66.0%
6	27/09/2021	91.06%	95.00%	72.0%
7	04/10/2021	100.00%	100.00%	72.0%
8	11/10/2021	100.00%	100.00%	100.0%

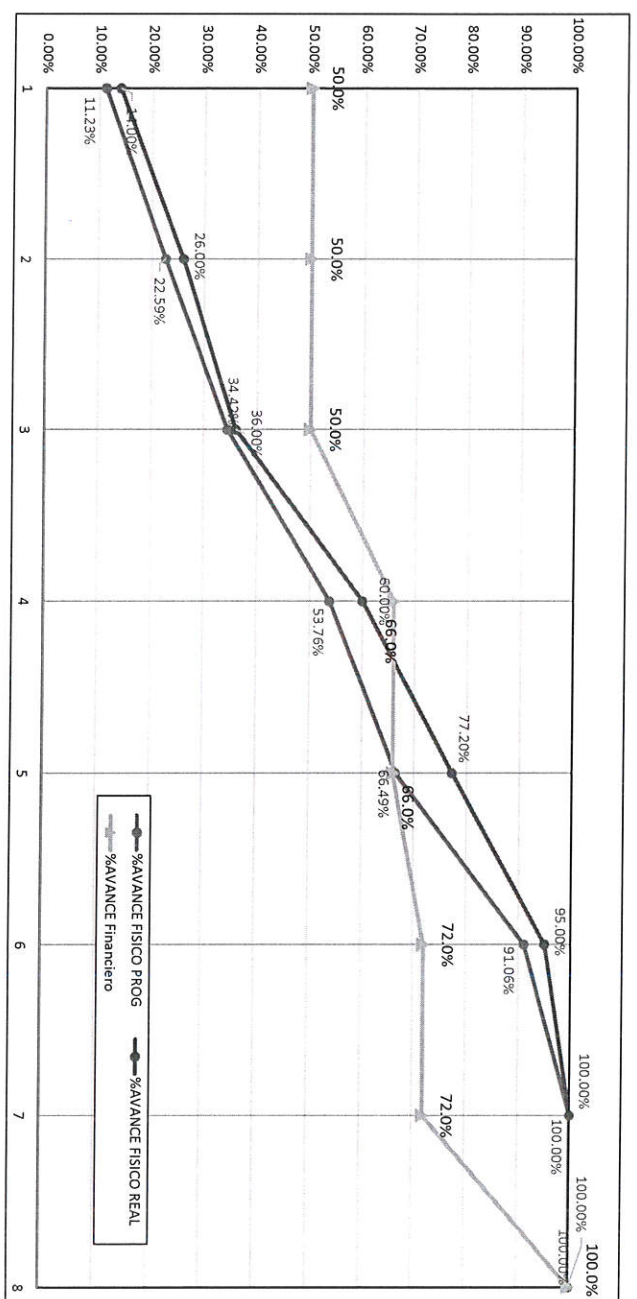

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Handwritten signature or mark in blue ink.
