


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	PF24 001 B/2024 PROYECTO DE INSTALACIONES "PLAZA ALFONSO ROMO DEL VIVAR, PORTAL Y FACHADAS PRESIDENCIA " INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES". ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE DECRETO 30 DE ENERO DE 1992, EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS."				
<b>Ubicación:</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contrato:</b>	PF24 001 B/2024		
<b>Tipo de inversión:</b>	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	<b>Contratista:</b>	INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.		
<b>Programa:</b>	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	<b>Inicio Vigente:</b>	jueves, 10 de octubre de 2024	<b>Días de Obra:</b>	<b>60</b>
<b>Subprograma:</b>	03 SERVICIOS	<b>Inicio Real:</b>	jueves, 10 de octubre de 2024	<b>Monto Contratado:</b>	<b>\$210,653.89</b>
<b>Residente:</b>	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	<b>Fin Vigente:</b>	domingo, 8 de diciembre de 2024	<b>Monto Ejercido:</b>	<b>\$210,653.89</b>
		<b>Fin Real:</b>	domingo, 8 de diciembre de 2024		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	09/11/2024	48.12%	48.12%	50.0%
2	09/12/2024	100.00%	100.00%	50.0%
3	08/01/2025	100.00%	100.00%	100.0%
4	07/02/2025	100.00%	100.00%	100.0%

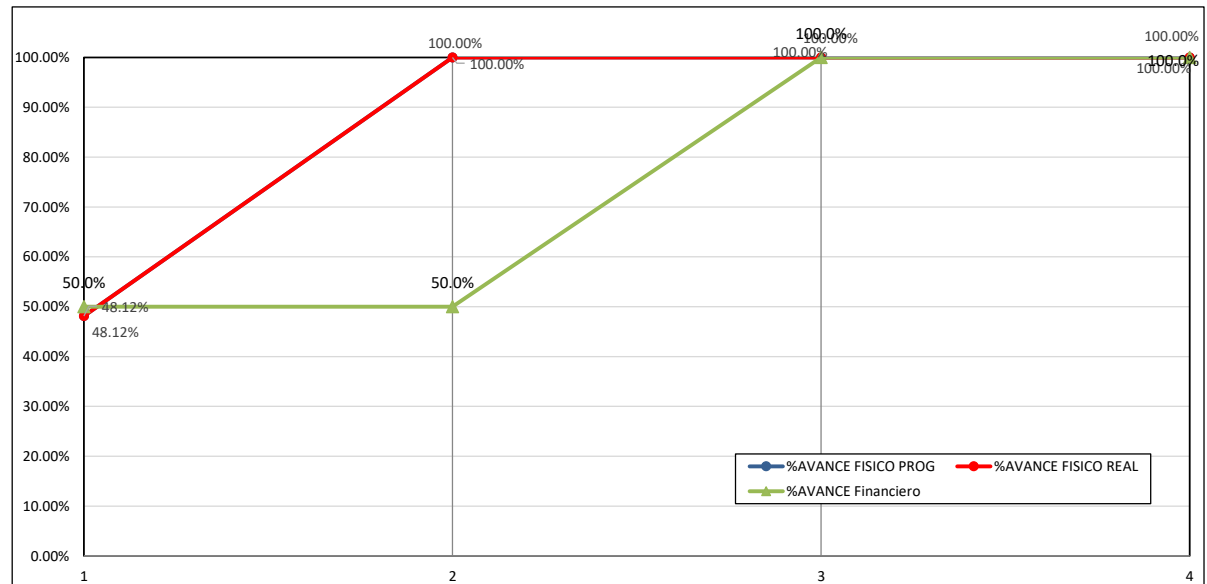

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
