


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	PF24 001 C/2024 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - PROYECTO EJECUTIVO "PLAZA ALFONSO ROMO DEL VIVAR, PORTAL Y FACHADAS PRESIDENCIA " REMODELACION ACABADOS Y EQUIPAMIENTO". ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE DECRETO 30 DE ENERO DE 1992. EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO. AGS."	<b>Contrato:</b>	PF24 001 C/2024
<b>Ubicación:</b>	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contratista:</b>	C. ANTONIO FRANCISCO MUÑOZ RODRIGUEZ
<b>Tipo de inversión:</b>	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	<b>Inicio Vigente:</b>	sábado, 14 de septiembre de 2024
<b>Programa:</b>	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	<b>Días de Obra:</b>	60
<b>Subprograma:</b>	03 SERVICIOS	<b>Inicio Real:</b>	sábado, 14 de septiembre de 2024
<b>Residente:</b>	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	<b>Fin Vigente:</b>	martes, 12 de noviembre de 2024
		<b>Fin Real:</b>	martes, 12 de noviembre de 2024
		<b>Monto Contratado:</b>	\$293,205.27
		<b>Monto Ejercido:</b>	\$293,205.27

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	16/09/2024	42.29%	42.29%	0.0%
2	30/09/2024	51.84%	51.84%	0.0%
3	14/10/2024	75.71%	75.71%	0.0%
4	28/10/2024	92.76%	92.76%	0.0%
5	11/11/2024	99.55%	99.55%	0.0%
6	25/11/2024	100.00%	100.00%	100.0%

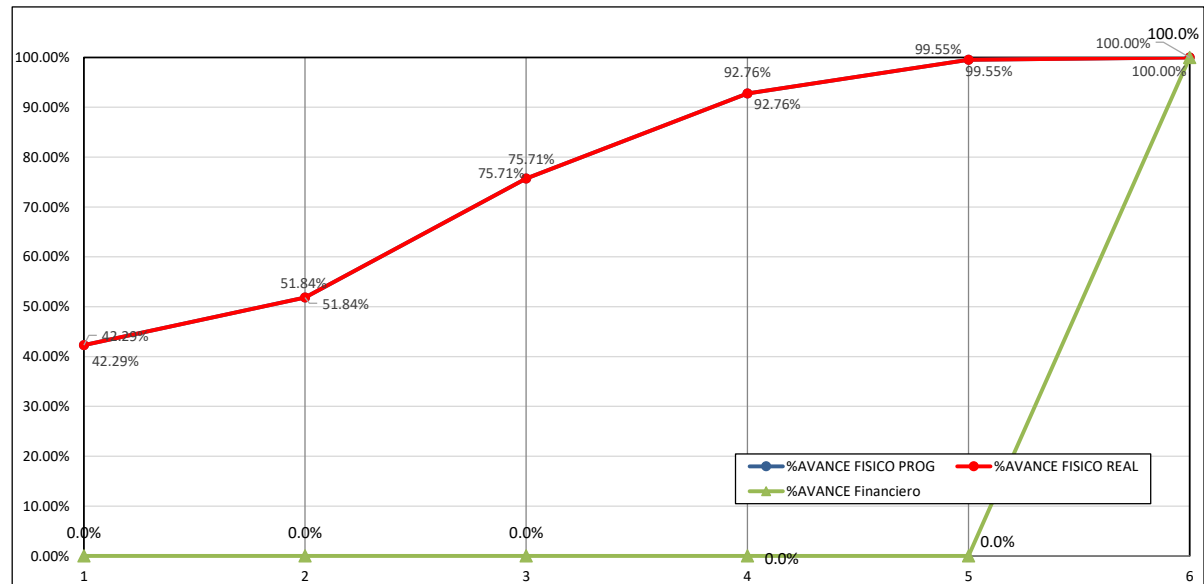

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
