

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF 004/2025 REHABILITACIÓN DE SOCAVON EN LA CALLE PROGESO INTERSECCIÓN CON CALLE JUSTICIA, EN EL FRACC. SAN JOSÉ DEL BARRANCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: PF 004/2025

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

Contratista: O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.,

Programa: SD ALCANTARILLADO

Inicio Vigente: martes, 26 de agosto de 2025

Días de Obra: 15

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Inicio Real: martes, 26 de agosto de 2025

Monto Contratado: \$ 667,917.80


Residente: ARQ. JOSE DE JESUS ESPARZA CALDERA

Fin Vigente: martes, 9 de septiembre de 2025

Monto Ejercido: \$ 667,917.80

Fin Real: martes, 9 de septiembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	26/08/2025	16.78%	16.78%	0.00%
2	02/09/2025	84.79%	84.79%	0.00%
3	09/09/2025	100.00%	100.00%	0.00%
4	16/09/2025	100.00%	100.00%	100.00%

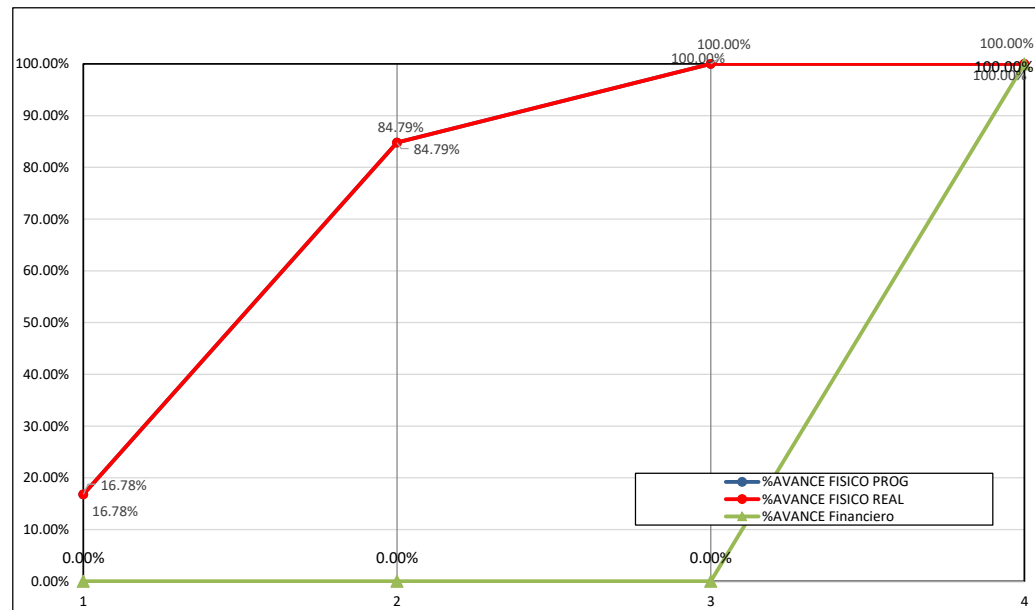

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
