

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FAISMUN 011/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS DE LA CALLE JOSÉ MA. CHÁVEZ A CALLE JESÚS TERÁN, FRACC.REVOLUCIÓN, EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ubicación: FRACC.REVOLUCIÓN, EN CABECERA MUNICIPAL

Contrato: FAISMUN 011/2025

Tipo de inversión: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS SD ALCANTARILLADO Y SC AGUA POTABLE

Contratista: CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Programa:

Inicio Vigente: jueves, 11 de diciembre de 2025

Días de Obra: 30

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Inicio Real: jueves, 11 de diciembre de 2025

Monto Contratado: \$736,793.31


Residente: ARQ. JOSE ALFREDO DE VELASCO LARA

Fin Vigente: viernes, 9 de enero de 2026

Monto Ejercido:

Fin Real: viernes, 9 de enero de 2026

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	26/12/2025	58.11%	59.11%	50.00%
2	25/01/2026			
3	25/02/2026			
4	28/03/2026			

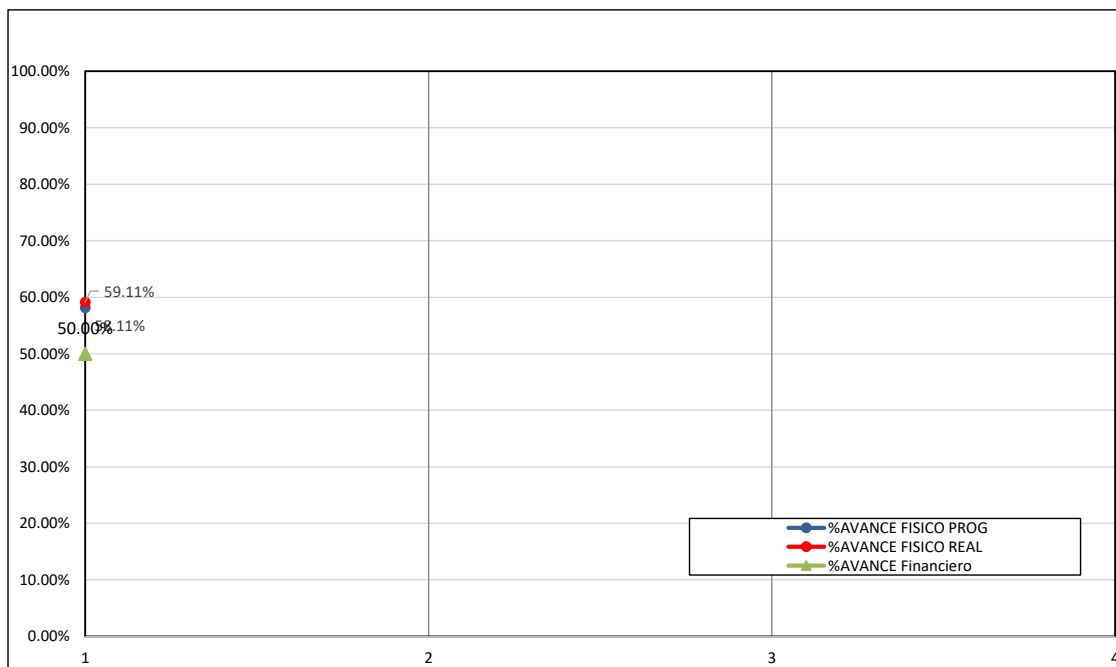

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
