


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

<b>Obra:</b>	PF 001 J/2025 ESTUDIO DE IMPACTO LUMINICO PARA CALLE PARAISO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y AV. SAUCE, FRACCIONAMIENTO LOS CEDROS; CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CARRETERA A LIBRAMIENTO LUIS MOYA, COL. 28 DE ABRIL; CALLE 31 DE FEBRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, COL. 28 DE ABRIL; CALLE EMILIANO ZARATA ENTRE AV. BENITO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO				
<b>Ubicación:</b>	San Francisco de los Romo		<b>Contrato:</b>	PF 001J/2025	
<b>Tipo de inversión:</b>	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025		<b>Contratista:</b>	CR 18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	
<b>Programa:</b>	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.		<b>Inicio Vigente:</b>	sábado, 12 de julio de 2025	<b>Días de Obra:</b> 15
<b>Subprograma:</b>	03 SERVICIOS		<b>Inicio Real:</b>	sábado, 12 de julio de 2025	<b>Monto Contratado:</b> \$ 120,127.79
<b>Residente:</b>	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES		<b>Fin Vigente:</b>	sábado, 26 de julio de 2025	<b>Monto Ejercido:</b> \$ 120,127.79
			<b>Fin Real:</b>	sábado, 26 de julio de 2025	

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/07/2025	6.01%	6.01%	0.00%
2	26/07/2025	51.24%	51.24%	0.00%
3	02/08/2025	100.00%	100.00%	100.00%

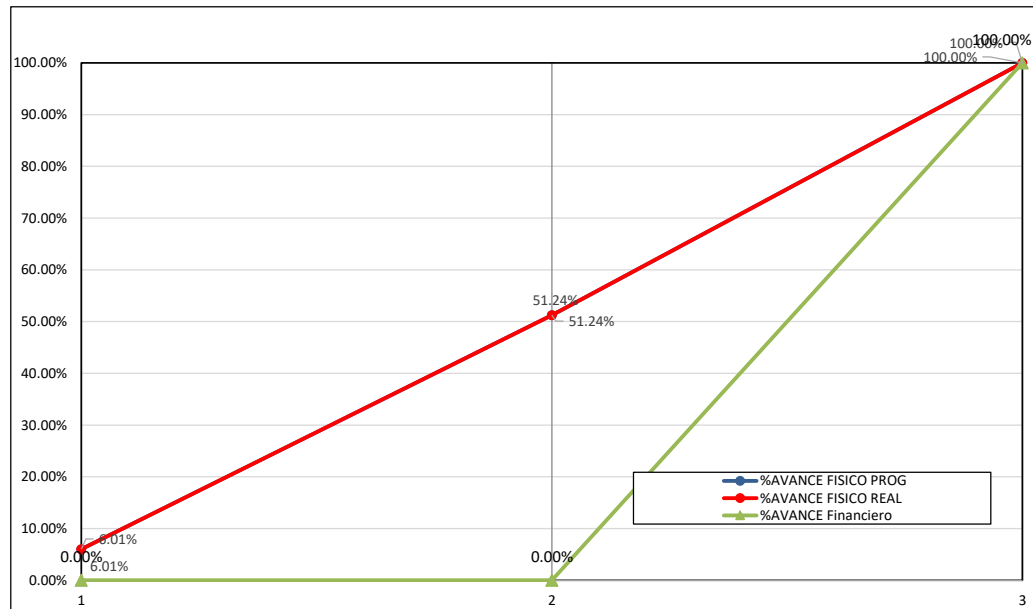

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
