GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FAISMUN 016/2024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CANDILES TRAMO CALLE POZO NUEVO A CALLE PONIENTE Y DE CALLE PONIENTE A MITAD DEL TRAMO DE LA CALLE PONIENTE A CALLE SAN MARTÍN , REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CANDILES TRAMO CALLE POZO NUEVO A CALLE PONIENTE Y DE CALLE PONIENTE A MITAD DEL TRAMO DE LA CALLE PONIENTE A CALLE SAN MARTÍN.**

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: FAISMUN 016/2024

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024

Contratista: LEOPOLDO MORONES FONSECA

Programa: SC AGUA POTABLE
SD ALCANTARILLADO

Inicio Vigente: miércoles, 5 de junio de 2024

Días de Obra: **30**

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Inicio Real: miércoles, 5 de junio de 2024

Monto Contratado: **$1,069,720.00**

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Fin Vigente: jueves, 4 de julio de 2024

Monto Ejercido: **$1,069,720.00**

Fin Real: jueves, 4 de julio de 2024

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	08/06/2024	4.50%	4.98%	47.1%
2	15/06/2024	27.52%	29.47%	47.1%
3	22/06/2024	59.04%	62.88%	47.1%
4	29/06/2024	90.85%	96.12%	47.1%
5	06/07/2024	100.00%	100.00%	47.1%
6	13/07/2024	100.00%	100.00%	63.0%
7	20/07/2024	100.00%	100.00%	63.0%
8	27/07/2024	100.00%	100.00%	100.0%
9	03/08/2024	100.00%	100.00%	100.0%

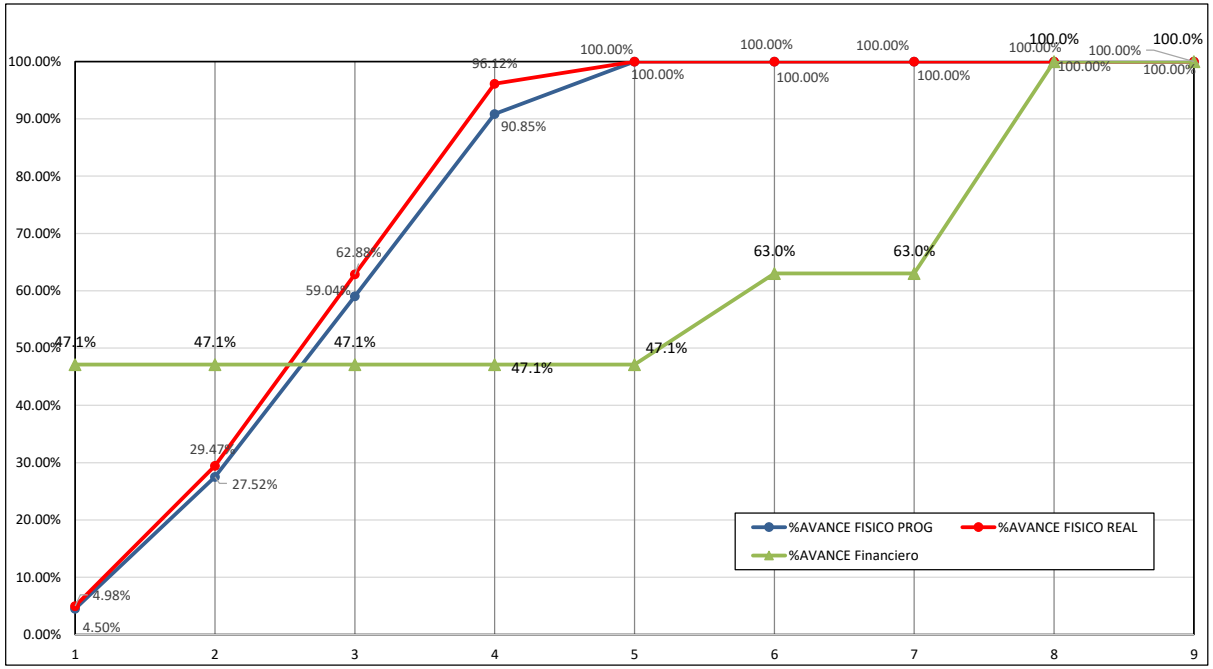

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
