GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **IP 001 B/2024 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 18 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA)**

Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	**Contrato:**	IP 001 B/2024		
Tipo de inversión:	IP INGRESOS PROPIOS 2024	**Contratista:**	INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.,		
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	**Inicio Vigente:**	sábado, 27 de enero de 2024	**Días de Obra:**	**30**
Subprograma:	03 SERVICIOS	**Inicio Real:**	sábado, 27 de enero de 2024	**Monto Contratado:**	**$63,735.55**
Residente:	ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA	**Fin Vigente:**	domingo, 25 de febrero de 2024	**Monto Ejercido:**	**$63,735.55**
		Fin Real:	domingo, 25 de febrero de 2024		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/01/2024	4.55%	5.20%	0.0%
2	06/02/2024	51.67%	51.67%	0.0%
3	13/02/2024	70.00%	72.50%	0.0%
4	20/02/2024	85.00%	87.00%	0.0%
5	27/02/2024	100.00%	100.00%	0.0%
6	05/03/2024	100.00%	100.00%	100.0%

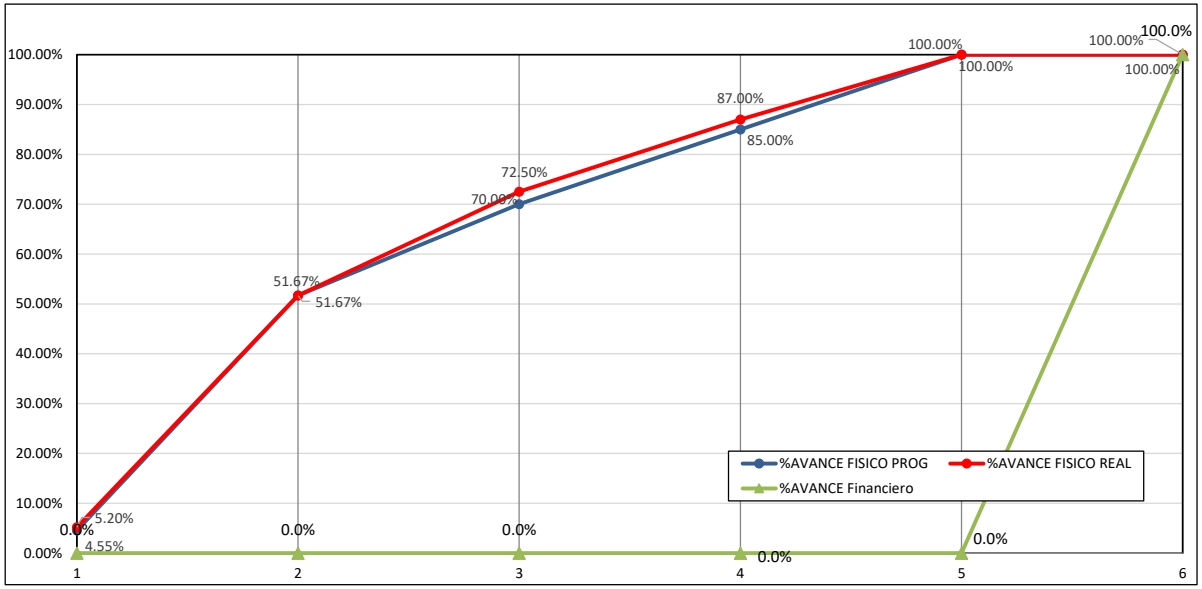

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
