GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **IP24 003/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SANTA CRUZ DE CALLE FRANCISCO PONCE-MEZQUITE**
IP24 004/2025 RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SEÑALÉTICA; Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO FRANCISCO I. MADERO AL ARROYO.
IP24 006/2025 RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SEÑALÉTICA; Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: IP24 003 004 006/2025

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

Contratista: CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.

Programa: SC AGUA POTABLE, SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, SF URBANIZACIÓN

Inicio Vigente: viernes, 20 de junio de 2025

Días de Obra: **75**

Subprograma: 01,03,05 REHABILITACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO

Inicio Real: viernes, 20 de junio de 2025

Monto Contratado: **$3,082,416.48**

Residente: ING. JUAN BELMARES VENTURA

Fin Vigente: martes, 2 de septiembre de 2025

Monto Ejercido:

Fin Real: martes, 2 de septiembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/06/2025	2.56%	2.89%	50.00%
2	01/07/2025			
3	08/07/2025			
4	15/07/2025			
5	22/07/2025			
6	29/07/2025			
7	05/08/2025			
8	12/08/2025			
9	19/08/2025			

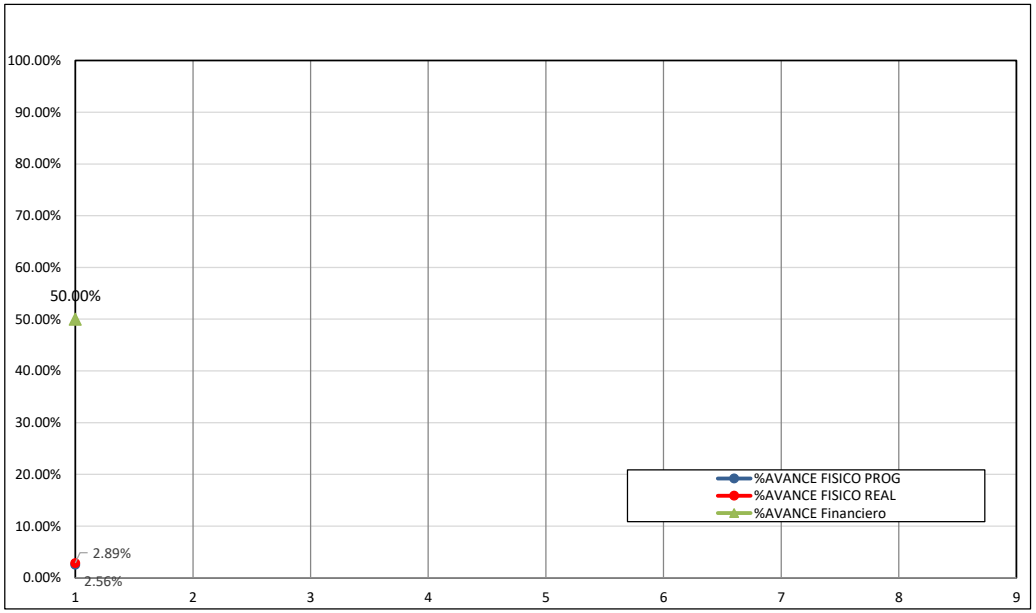

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
