GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FAISMUN 006/2025 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, CONSTUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALETICA, ALUMBRADO PUBLICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PARAISO DE CALLE SAUCE A LA CALLE PALMA.**
FAISMUN 007/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; Y SEÑALETICA EN CALLE VIÑEDOS SAN FERNANDO DE AV. CONSTITUCION A CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS.

Ubicación: EXVIÑEDOS GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Tipo de inversión: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

Programa: SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, SE URBANIZACIÓN, SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

Subprograma: 01,03,05 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO

Residente: ARQ. GUSTAVO DE SANTIAGO REYES

Contrato: FAISMUN 006 007/2025

Contratista: DAPAC DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.,

Inicio Vigente: miércoles, 16 de julio de 2025

Inicio Real: miércoles, 16 de julio de 2025

Fin Vigente: sábado, 13 de septiembre de 2025

Fin Real: sábado, 13 de septiembre de 2025

Días de Obra: **60**

Monto Contratado: **$5,296,226.28**

Monto Ejercido: **$5,244,908.30**

Se solicita nota de credio

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/07/2025	15.28%	17.26%	50.48%
2	30/08/2025	78.08%	82.56%	66.85%
3	30/09/2025	100.00%	100.00%	97.30%
4	31/10/2025	100.00%	100.00%	100.00%

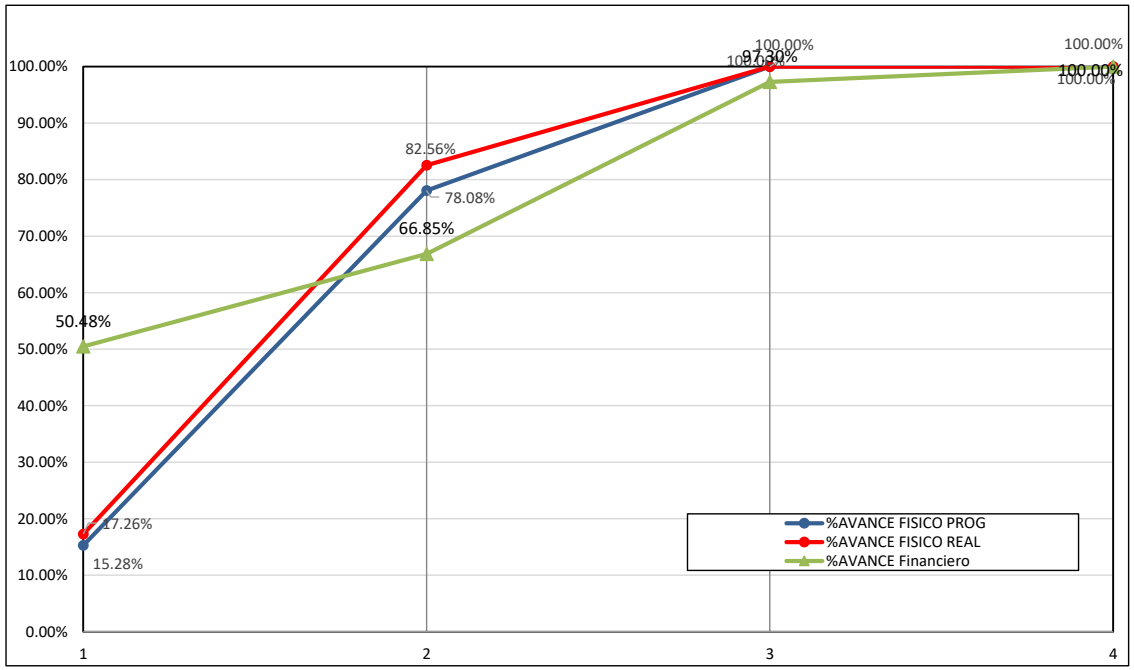

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
