GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **IP24 003/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SANTA CRUZ DE CALLE FRANCISCO PONCE-MEZQUITE**
IP24 004/2025 RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SEÑALÉTICA; Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO FRANCISCO I. MADERO AL ARROYO.
IP24 006/2025 RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SEÑALÉTICA; Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

Programa: SC AGUA POTABLE, SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, SF URBANIZACIÓN

Subprograma: 01,03,05 REHABILITACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO

Residente: ING. JUAN BELMARES VENTURA

Contrato: IP24 003 004 006/2025

Contratista: CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: viernes, 20 de junio de 2025

Inicio Real: viernes, 20 de junio de 2025

Fin Vigente: martes, 2 de septiembre de 2025

Fin Real: martes, 2 de septiembre de 2025

Días de Obra: **75**

Monto Contratado: **$3,082,416.48**

Monto Ejercido: **$2,993,374.22**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/06/2025	36.90%	38.01%	51.49%
2	15/07/2025	80.33%	80.34%	54.03%
3	30/07/2025	86.09%	86.51%	61.66%
4	14/08/2025	93.01%	93.85%	94.75%
5	29/08/2025	99.23%	99.27%	95.80%
6	13/09/2025	100.00%	100.00%	96.85%
7	28/09/2025	100.00%	100.00%	100.00%
8	13/10/2025	100.00%	100.00%	100.00%
9	28/10/2025	100.00%	100.00%	100.00%

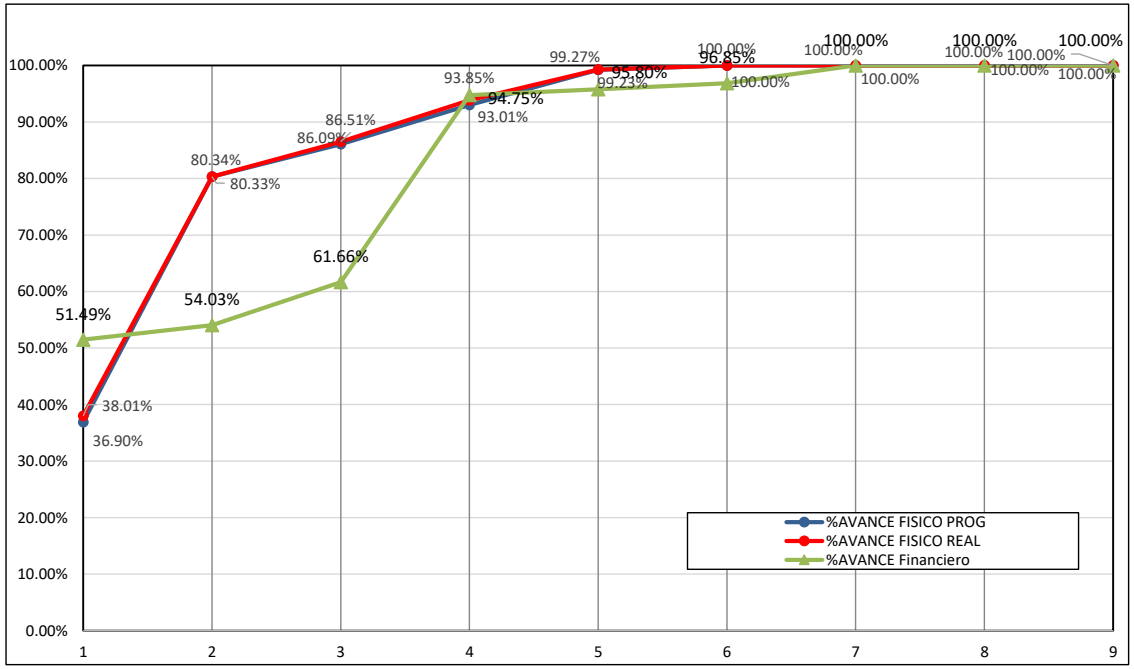

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
